



ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

Liburnska obala 6, 23 000 Zadar, telefon: 023-250-563, 023-250-565, fax: 023-250-564

www.cpa-zadar.hr, info@cpa-zadar.hr

KLASA: 342-21/16-01/763
URBROJ: 2198-1-87-16-2
ZADAR, 08. studenog 2016. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za more i turizam
Božidara Petranovića 8
ZADAR 23000

**Predmet: Zahtjev za proračunska sredstva iz proračuna Zadarske županije
za 2016. godinu**

Molimo Naslov da nam uplati sredstva iz proračuna Zadarske županije za 2016. u iznosu od 878.018,68 kuna, za obavljene betonske i armiranobetonske građevinske radove na Izgradnji luke Tkon, otok Pašman, Zadarska županija-faza I. i faza II.

Program: 4102 Županijska lučka uprava Zadar

Kapitalni projekt: K 4102-02 – Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture
36329-Sufin. izgradnje pomorske infrastrukture

878.018,68 kuna

S poštovanjem,

*Ravnatelj:
Davor Škibola, dipl.ing.*

Privitak

1. XII. Privremena situacija 0211/1/16
2. Mjesečno izvješće za listopad 2016.



REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska županija

Primljeno:	9.11.2016	
Klasifikacijska oznaka:	Org.jed.	
NP-342-21/16-1/1	08	
Uredžbeni broj:	Pril:	Vrijednost:
2198-1-87-16-11	-	-

PC 53 314 0429 ke

Izvođač radova: **KALI GRADNJA d.o.o.**,

Put Vele Luke 71, 23 272 Kali

OIB: 06580734617

Gradilište: IZGRADNJA LUKE TKON, otok Pašman, Zadarska županija - faza I. I faza II.

Radilište: Tkon

Mjesto: otok Pašman

U Zadru, 02.11.2016. godine

XII. PRIVREMENA SITUACIJA 0211/1/16

Za obavljene radove zaključno s mjesecom Listopad 2016.

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa **Izvođenje građevinskih radova na izgradnji luke Tkon, otok Pašman, Zadarska županija - faza I. I faza II.**

Naručitelj: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA, Liburnska obala 6/5, 23000 Zadar	OIB: 58398165411
Ugovor: 08/2015, Klasa:342-21/15-01/288 Urbroj:2198-1-87-15-8 od 22. srpnja 2015. godine. Ukupna ugovorena vrijednost bez PDV-a 10.206.554,94 Kn / sa PDV-om 12.758.193,68 Kn	

	Vrijednost bez PDV-a	PDV	Kn UKUPNO sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavlj.radova	9.772.121,89	2.443.030,47	12.215.152,37
Vrijednost radova po pr. situac.	8.498.492,28	2.124.623,07	10.623.115,35
Vrijednost radova po XII. priv	1.273.629,61	318.407,40	1.592.037,01
U k u p n o	9.772.121,89	2.443.030,47	12.215.152,37

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz uloška gr.knjige.

Krešimir Miličević ing. građ. *M*

Situaciju sastavio

Nadzorno tijelo

KALI GRADNJA d.o.o.

IZVOĐAČ

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA

Naručitelj gradnje

Zadar, 02.11.2016.

MJESTO I DATUM

OBRAČUN PLAĆANJA	NETTO	PDV	UKUPNO
Ukupno obrač. po ovoj situaciji	1.273.629,61	318.407,40	1.592.037,01
Retencija 15 %	191.044,44	47.761,11	238.805,55
Za isplatu	1.082.585,17	270.646,29	1.353.231,46
Kod plaćanja u pozivu na broj odobrenja upisati model: xx i broji ovog računa	Banka: Partner banka Transakcijski račun broj: HR5424080021100043473		

Gradevina:	Izgradnja luke Tkon I i II faza
Naručitelj:	Županijska lučka uprava Zadar
Projektant:	STRABAG INŽENJERIG: Split
Izvođač:	"KALI GRADNJA" d.o.o. Kali
Nadzor:	«dassacommerce» d.o.o./Zadar, Put Petrića 49 d-mr.se., Josip Babeli d.i.g.
Ugovor s izvođačem	
Ugovor s nadzorom	
Vrijednost radova bez PDV	10.206.554,94
PDV	2.551.368,74
UKUPNO IZVOĐENJE	12.758.193,68
Početak radova	21.08.2015., UPIS U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU
Ugovorni rok završetka radova	365 kalendarskih dana

MJESEČNO IZVJEŠĆE ZA LISTOPAD 2016.

1. AKTIVNOSTI:

- 1.1. Radovi su se izvodili u punom intezitetu bez problema sa vremenskim neprilikama.
- 1.2. Izvedeni su radovi na motaži elemenata trajektnog pristana
- 1.3. Izvedeni su AB nadmorski zidovi trajektnog platoa

Predano je Investitoru dokumentacija iz kojih se vidi prikaz radova i financija Ugovoreno i objekat u funkciji sa percepcijom na 10. mjesec 2016. godine. Iz tabularnog prikaza pod rekapitulacijom je vidljivo da je došlo do viška armature od predviđenog, više nasipa u temelju trajektnog pristana kao i manje radova po nekim stavkama troškovnika. Iz takve analize je

- 1.4. vidljivo da je potrebno dogovoriti iznos od 277.127,80 Održana je koordinacija 27.10.2016. godine u prostorijama Županijske lučke uprave Zadar gdje je
- 1.5. bilo govora:
 1. O prekoračenju ugovorenog iznosa
 2. O stanju radova
 3. Razmišljanja o novim fazama izvođenja kako bi se građevina mogla staviti u funkciju sa ishođenjem uporabne dozvole.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA
ZADAR

03.11.2016

IZVJEŠĆE ZA LISTOPAD 2016.

[Handwritten signature]

2. IZVOĐENJE

2.1.

2.2.

SLAGANJE ELEMENATA GATA
NASIPAVANJE UNUTAR ELEMENATA
IZVEDBA NADMORSKIH ZIDOVA

3.

Popravne mjere za otklanjanje neusklađenosti izvedeno/planirano
Nastaviti pojačanim aktivnostima da bi se radovi
završili u ovoj godini

3.1.

3.2.

Odgovorne osobe za točku 3

Izvođač radova koji treba u 10. mjesecu nadoknaditi realizaciju od
717.285,30 i planiranu realizaciju u iznosu od 859.235,92 kn što znači
da realizacija za 10. mjesec treba iznositi minimum 1.576.521,22 kn







Pokrenuti postupak aneksiranja za prekoračenje
ugovorenog iznosa- odgovorne osobe Investitor.



Podaci o napredovanju

3. Postotak realizacije ukupno

Planirano u kunama ZAKLJUČNO SA 10.. Mjeseca po osnovnom dinamičko financijskom planu	10.015.176,93
Planirano u kunama ZAKLJUČNO SA 10.. Mjeseca po 1. rebalansu dinamičko financijskog plana	9.974.307,94
Realizirano sa 10. mj. ukupno do sada	9.772.121,89
Postotak realizacije u odnosu na planirano rebalansom	97,97%
Postotak realizacije u odnosu na ukupno	95,74%
Ugovoreni iznos	10.206.554,94
Trebalo je realizirati po osnovnom dinamičko financijskom planu	10.015.176,93
Postotak realizacije prema osnovnom dinamičko financijskom planu	97,57
Realizirano 10. mjesec	1.273.629,61
Zaostatak u postocima iznosi	2,43%
Zaostaci u kn	248.019,29

4. Foto dokumentacija

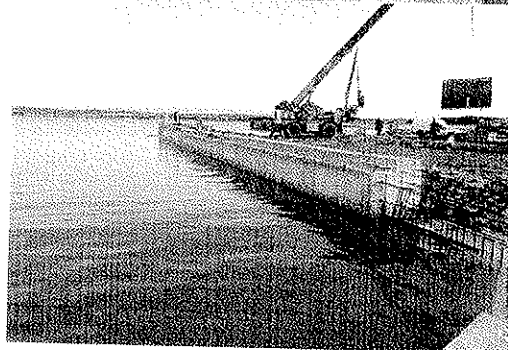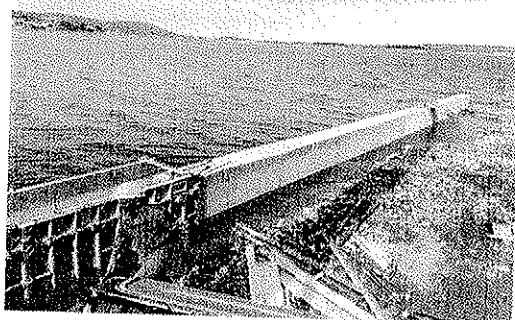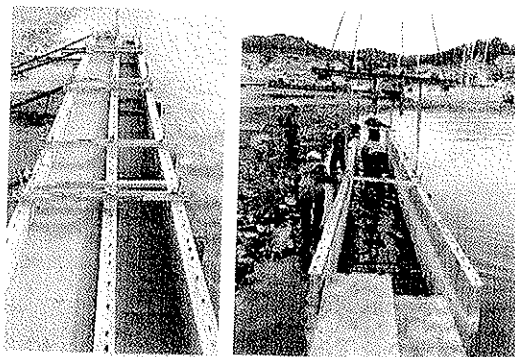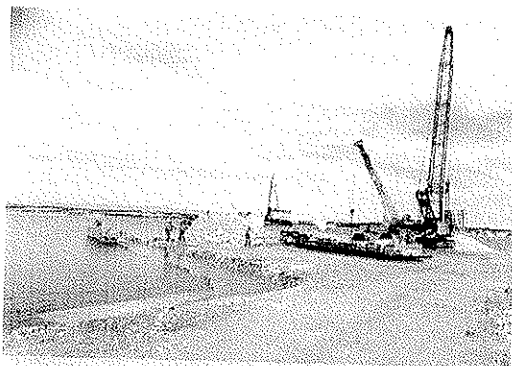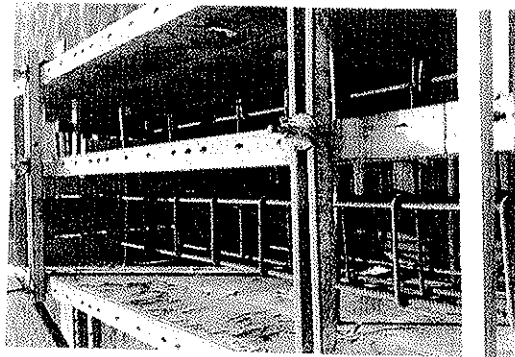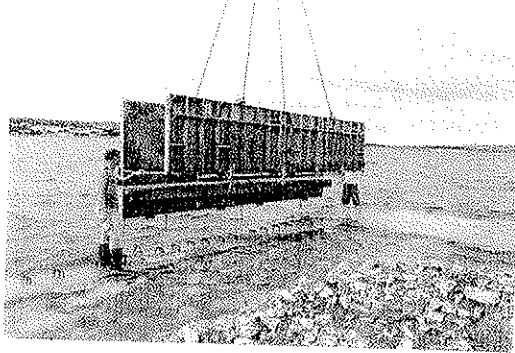

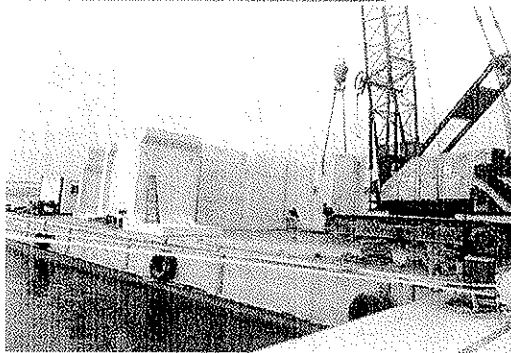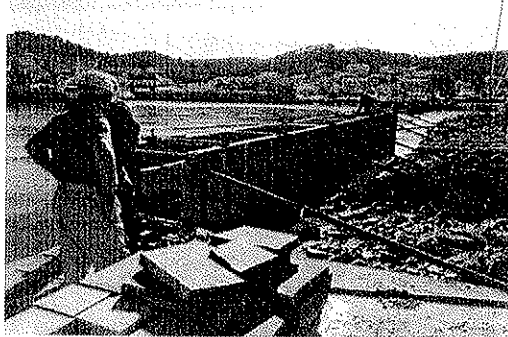

Izradio:
mr.sc.Josip Babeli d.j.g.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke, positioned above the typed name.

A faint, circular stamp or seal, possibly a company or official seal, located below the signature. The text within the stamp is illegible due to its low contrast.
